

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA	<i>Realizó: O. de Giovanni</i>
		<i>Fecha: Dic/2019</i>
		<i>Página 1 de 4</i>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA

INFRAESTRUCTURA

LINEA BELGRANO SUR

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – ADQUISICION DE TALLER MODULAR

IF-2020-07401752-APN-GGCAYL#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA	<i>Realizó: O. de Giovanni</i>
		<i>Fecha: Dic/2019</i>
		<i>Página 2 de 4</i>

Especificaciones Técnicas para alquiler de modulo doble para instalación provisoria.

Especificaciones técnicas

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren al alquiler de 1 (un) habitáculo modular doble, tipo Basani o similar, el cual servirá para ser utilizado como oficina de administración de la Sub-Gerencia de Infraestructura de LBS.

La fabricación y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

El habitáculo destinado a oficina deberá contar con las siguientes características:

- Medidas Aproximadas:
- Largo: 6.00mts / Ancho: 4.60 mts (Base). / Alto: 2.30 mts
- Peso Aproximado: 2000kg

Colores: Chapa Galvanizada o Pintado

Especificaciones: Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de dimensiones acordes a las cargas propias de un taller de 1,60 mm a 2,00 mm de espesor. El piso deberá ser de multilaminado fenólico de 18 mm (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito y resistente a solventes)

Equipamiento:

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA	<i>Realizó: O. de Giovanni</i>
		<i>Fecha: Dic/2019</i>
		<i>Página 3 de 4</i>

- Una puerta de 0.82 x 2.10 mts.
- Dos ventanas guillotina de 1,00 m x 1,00 m, al frente, con marco de aluminio y vidrio de 3mm.
- Instalación eléctrica e iluminación completa: Compuesta de luminaria interna con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termo-magnética.
- Aislación térmica-acústica en cielorraso y paredes laterales con polietileno expandido
- Terminación interior en chapadur plus o similar.
- Apertura para dos equipos de aire acondicionado.

Garantía

Los oferentes garantizarán los módulos adjudicados por lo menos por el término de cuatro (4) meses a partir de la entrega, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso. La atención de la garantía se deberá brindar en el sitio designado como lugar de entrega en el presente documento.

Forma de cotizar

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados y montaje, como fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

Plazo de entrega

Inmediata.

Dirección de entrega

Este módulo deberá ser entregado en Gorriti 1950, Tapiales. en fecha y horario previamente acordados. El módulo debe entregarse y montarse en el predio que posee el Área Infraestructura en lugar a indicar por su personal en dicho predio.

Contacto

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – ADQUISICION DE TALLER MODULAR

IF-2020-07401752-APN-GGCAYL#SOFSE




TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA	
	<i>Realizó: O. de Giovanni</i>	
<i>Fecha: Dic/2019</i>		
<i>Página 4 de 4</i>		

Los diseños finales previos a la construcción del módulo e instalaciones deben ser aprobados por SOFSE.

Para solicitar aclaraciones comunicarse: Sr. Meehan Sergio (Coordinador de Planeamiento y Control)

Tel. (54 11) 4462-4000 Int. 53025. e-mail: sergio.meehan@trenesargentinos.gob.ar

Imágenes orientativas

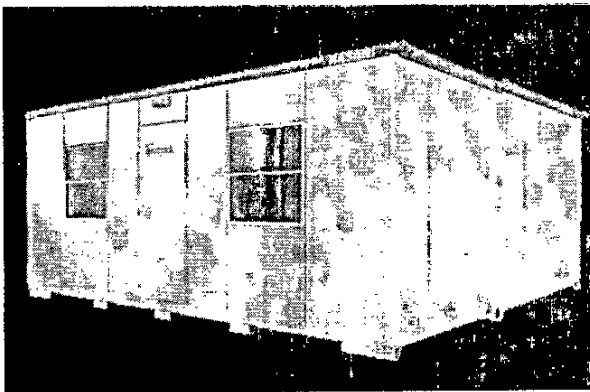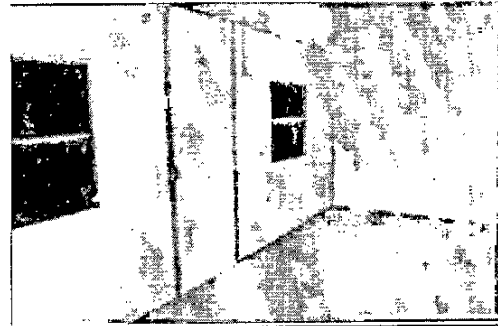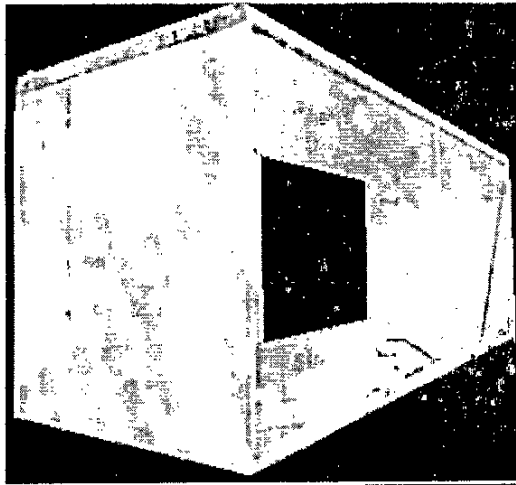


Sergio D. Meehan
 Infraestructura
 Línea Belgrano Sur
 Trenes Argentinos
 Coordinador de Planeamiento y Control



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Técnicas

Número: IF-2020-07401752-APN-GGCAYL#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 3 de Febrero de 2020

Referencia: PLIEGO SOLPE 10001047 - 10001048 MODULOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.03 12:00:48 -03:00

Eluned Lloyd
Asistente administrativo
Gerencia General Compras, Abastecimiento y Logística
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.03 12:01:14 -03:00
