

<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>	<b>SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>	
	ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA	<i>Realizó: O. de Giovanni</i>
		<i>Fecha: Feb/2019</i>
		<i>Página 1 de 4</i>

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

# ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA

INFRAESTRUCTURA

LINEA BELGRANO SUR



<b>TRENES ARGENTINOS</b> <b>OPERACIONES</b>	<b>SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>	
	ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA	<i>Realizó: O. de Giovanni</i>
		<i>Fecha: Feb/2019</i>
		<i>Página 2 de 4</i>

**Especificaciones Técnicas para alquiler de modulo doble para instalación provisoria.**

Especificaciones técnicas

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren al alquiler de 1 (un) habitáculo modular doble, tipo Basani o similar, el cual servirá para ser utilizado como oficina de administración de la Sub-Gerencia de Infraestructura de LBS.

La fabricación y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.


El habitáculo destinado a oficina deberá contar con las siguientes características:

- Medidas Aproximadas:
- Largo: 6.00mts / Ancho: 4.60 mts (Base). / Alto: 2.30 mts
- Peso Aproximado: 2000kg

Colores: Chapa Galvanizada o Pintado

Especificaciones: Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de dimensiones acordes a las cargas propias de un taller de 1,60 mm a 2,00 mm de espesor. El piso deberá ser de multilaminado fenólico de 18 mm (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito y resistente a solventes)

Equipamiento:



<b>TRENES ARGENTINOS</b> <b>OPERACIONES</b>	<b>SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>	
	ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA	<i>Realizó: O. de Giovanni</i>
		<i>Fecha: Feb/2019</i>
		<i>Página 3 de 4</i>

- Una puerta de 0.82 x 2.10 mts.
- Dos ventanas guillotina de 1,00 m x 1,00 m, al frente, con marco de aluminio y vidrio de 3mm.
- Instalación eléctrica e iluminación completa: Compuesta de luminaria interna con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termo-magnética.
- Aislación térmica-acústica en cielorraso y paredes laterales con polietileno expandido
- Terminación interior en chapadur plus o similar.
- Apertura para dos equipos de aire acondicionado.

#### Garantía

Los oferentes garantizarán los módulos adjudicados por lo menos por el término de seis (6) meses a partir de la entrega, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso. La atención de la garantía se deberá brindar en el sitio designado como lugar de entrega en el presente documento.

#### Forma de cotizar

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados y montaje, como fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

#### Plazo de entrega

Inmediata.

#### Dirección de entrega

Este módulo deberá ser entregado en Gorriti 1950, Tapiales. en fecha y horario previamente acordados. El módulo debe entregarse y montarse en el predio que posee el Área Infraestructura en lugar a indicar por su personal en dicho predio.

#### Contacto



<b>TRENES ARGENTINOS</b> <b>OPERACIONES</b>	<b>SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>	
	ALQUILER DE MODULO DOBLE PARA INSTALACION PROVISORIA	
	<i>Realizó: O. de Giovanni</i>	
		<i>Fecha: Feb/2019</i>
		<i>Página 4 de 4</i>

Los diseños finales previos a la construcción del módulo e instalaciones deben ser aprobados por SOFSE.

Para solicitar aclaraciones comunicarse: Sr. Meehan Sergio (Coordinador de Planeamiento y Control)

Tel. (54 11) 4462-4000 Int. 53025. e-mail: [sergio.meehan@trenesargentinos.gob.ar](mailto:sergio.meehan@trenesargentinos.gob.ar)

Imágenes orientativas

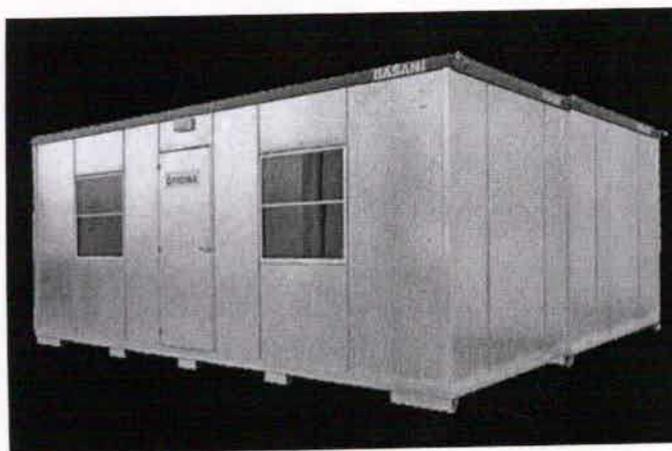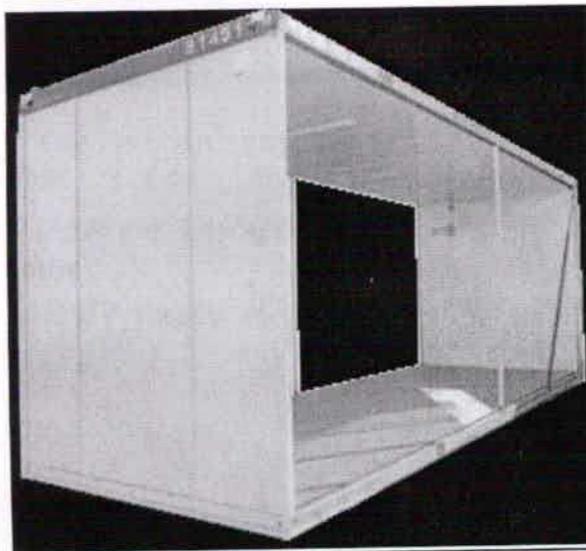

  
**Sergio D. Meehan**  
Infraestructura  
Línea Belgrano Sur  
Trenes Argentinos  
Operación Remanente



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas  
Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:**

**Referencia:** PLIEGO MODULO DOBLE.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
