

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MODULOS PRE FABRICADOS PARA BAÑOS Y VESTUARIOS DE PERSONAL

Normas, leyes e información técnica a consultar.

I.- Ley N° 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el trabajo. Decreto Reglamentario 351/79.

II Ley 24557 de Riesgos del Trabajo. Decreto Reglamentario 170/96

III.- El listado de normas y leyes antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni excluyente, por lo que el oferente deberá agregar aquellas inherentes al trabajo que se solicita.

Objeto.

En esta especificación se detallan los requerimientos técnicos, legales y constructivos para la provisión de Módulos Pre Fabricados para Baños y Vestuarios para Personal en la Línea Sarmiento para dar cumplimiento a la siguiente normativa nacional:

- Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario 351/79 y normas modificatorias y complementarias
- Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, su Decreto Reglamentario y normas modificatorias y complementarias

1. Alcance del servicio

1.1. Alcance general

El servicio requerido consta del alquiler de módulos para alquiler por un periodo de 12 (doce) meses para ser ubicados a lo largo de todo el emplazamiento de la Línea Sarmiento.

1.2. Ubicación y Cantidad de los módulos

Módulos para Sanitarios: Ver Anexo I

Módulos para Vestuarios: Ver Anexo I

Línea Sarmiento:

- Once – Moreno
- Moreno – Mercedes
- Merlo – Lobos


2. Características Constructivas:

2.1. Modulo para Sanitarios

- Medidas: 6.10 (largo) x 2.44 (ancho) x 2.59 (alto) – todas las medidas están expresadas en metros.
- Aberturas: Puerta de acceso de 0.75 x 2.00 m y 2 ventanas.
- Instalación eléctrica: llave de punto y toma corriente normalizado, 2 artefactos de iluminación tipo tubo y cableado completo bajo norma. Tablero eléctrico con llave térmica y disyuntor diferencial, jabalina y cable a tierra (bajo norma AEA y Ley 19587)
- Aislación térmica: paredes laterales con Poliestireno expandido.
- Piso: laminado y pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.


Equipamiento:

- 3 duchas con provisión de agua fría y caliente a través de termo tanque eléctrico.
- 3 box con inodoro.
- Mesada con bacha lavabo.

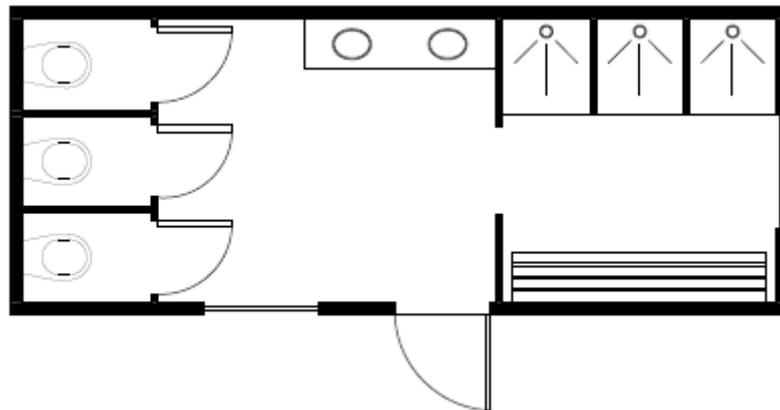

2.2. Modulo para Vestuario

- Medidas: 6.10 (largo) x 2.44 (ancho) x 2.59 (alto) – todas las medidas están expresadas en metros.
- Aberturas: Puerta de acceso de 0.75 x 2.00 m y 2 ventanas.
- Instalación eléctrica: llave de punto y toma corriente normalizado, 2 artefactos de iluminación tipo tubo y cableado completo bajo norma. Tablero eléctrico con llave térmica y disyuntor diferencial, jabalina y cable a tierra (bajo norma AEA y Ley 19587).
- Aislación térmica: paredes laterales con Poliestireno expandido.
- Piso: laminado y pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.

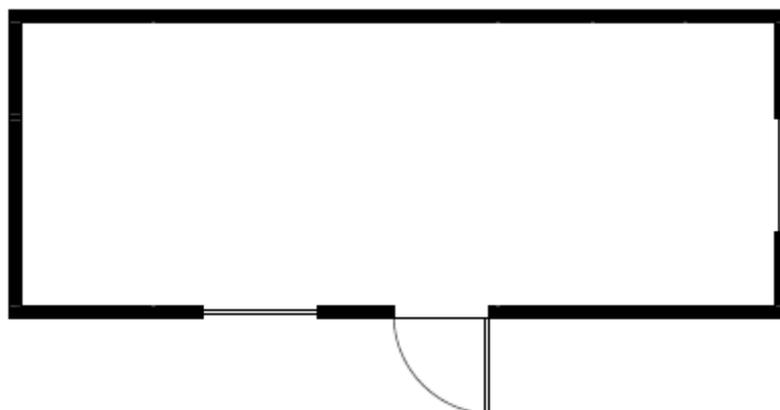

3. Coordinación de los plazos y las entregas

Todo será coordinado con la Sub Gerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE.

ANEXO I

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO MENSUAL | PRECIO ANUAL |
|----------|---|----------------|--------------|
| 10 | ALQUILER MODULOS PARA SANITARIOS Características Constructivas: Equipamiento: | | |
| 10 | ALQUILER MODULOS PARA VESTUARIOS Características Constructivas: Equipamiento: | | |
