SGVyO - Apeaderos Saenz Peña - Chorotis

Id	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras
1	**Tareas Previas**	**84 días?**	
2	Acta de Inicio	1 día?	
3	Documentación de ingreso	10 días	2
4	Proyecto Ejecutivo	10 días	2
5	Documentación Conforme a Obra	3 días	25;67
6	**APEADERO A**	**52 días**	
7	**DOCUMENTACION Y OBRADOR**	**5 días**	
8	Obrador	2 días	3
9	Cartel de Obra	1 día	3
10	Limpieza, demoliciones, vallado, señalización	1 día	3
11	Relevamiento	1 día	3
12	Estudio de suelo	5 días	4
13	**ANDEN**	**42 días**	
14	Movimiento de Suelos	3 días	3
15	Fundaciones	15 días	14;12
16	Mampostería de cierre bajo anden	5 días	15
17	Losas	2 días	16
18	Contrapiso	5 días	17
19	Solados especiales	5 días	18
20	Solado de Hormigón Peinado	5 días	19
21	Pintura	5 días	19
22	**REFUGIO**	**44 días**	
23	Fabricación refugio	30 días	4
24	Ejecución de bases de hormigón	10 días	17
25	Montaje Refugio	2 días	23;20
26	**ACCESOS**	**20 días**	
27	Ejecución de sendero de acceso	10 días	14
28	Ejecución rampa para personas con movilidad reducida	20 días	14
29	Ejecución de Pasos Peatonales y Laberintos	5 días	27
30	Ejecución de Cerco Romboidal	10 días	27
31	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN**	**52 días**	
32	Suministro	30 días	4FC-5 días
33	Tendido Eléctrico	10 días	4
34	Tablero	1 día	33
35	Columnas de iluminación	5 días	33;27
36	Art. iluminación en refugio	3 días	25
37	**BARANDAS METALICAS**	**22 días**	
38	Barandas metálicas perimetrales en anden	3 días	20
39	Baranda - pasamanos en Rampa de acceso	3 días	28
40	**MOBILIARIOS**	**2 días**	
41	Bancos	1 día	20
42	Cestos de residuos	1 día	41
43	**CARTELERIA**	**3 días**	
44	Cartel de estación	1 día	20
45	Cartel de recorrido y horarios	1 día	25
46	**VARIOS**	**2 días**	
47	Limpieza final de obra	2 días	21
48	**APEADERO B**	**78 días**	
49	**DOCUMENTACION Y OBRADOR**	**27 días**	
50	Relevamiento	1 día	3FC+2 días
51	Estudio de suelo	5 días	12
52	Obrador	2 días	17
53	Cartel de Obra	1 día	17
54	Limpieza, demoliciones, vallado, señalización	1 día	17
55	**ANDEN**	**40 días**	
56	Movimiento de Suelos	3 días	54
57	Fundaciones	15 días	51;56
58	Mampostería de cierre bajo anden	5 días	57
59	Losas	2 días	58
60	Contrapiso	5 días	59
61	Solados especiales	5 días	60
62	Solado de Hormigón Peinado	5 días	61
63	Pintura	5 días	61
64	**REFUGIO**	**50 días**	
65	Fabricación refugio	30 días	23FC-10 día
66	Ejecución de bases de hormigón	10 días	59
67	Montaje Refugio	2 días	62;65
68	**ACCESOS**	**20 días**	
69	Ejecución de sendero de acceso	10 días	56
70	Ejecución rampa para personas con movilidad reducida	20 días	56
71	Ejecución de Pasos Peatonales y Laberintos	5 días	69
72	Ejecución de Cerco Romboidal	10 días	69
73	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN**	**78 días**	
74	Suministro	30 días	4FC-5 días
75	Tendido Eléctrico	10 días	56
76	Tablero	1 día	75
77	Columnas de iluminación	5 días	69;75
78	Art. iluminación en refugio	3 días	67
79	**BARANDAS METALICAS**	**20 días**	
80	Barandas metálicas perimetrales en anden	3 días	62
81	Baranda - pasamanos en Rampa de acceso	3 días	70
82	**MOBILIARIOS**	**2 días**	
83	Bancos	1 día	62
84	Cestos de residuos	1 día	83
85	**CARTELERIA**	**3 días**	
86	Cartel de estación	1 día	62
87	Cartel de recorrido y horarios	1 día	67
88	**VARIOS**	**2 días**	
89	Limpieza final de obra	2 días	63

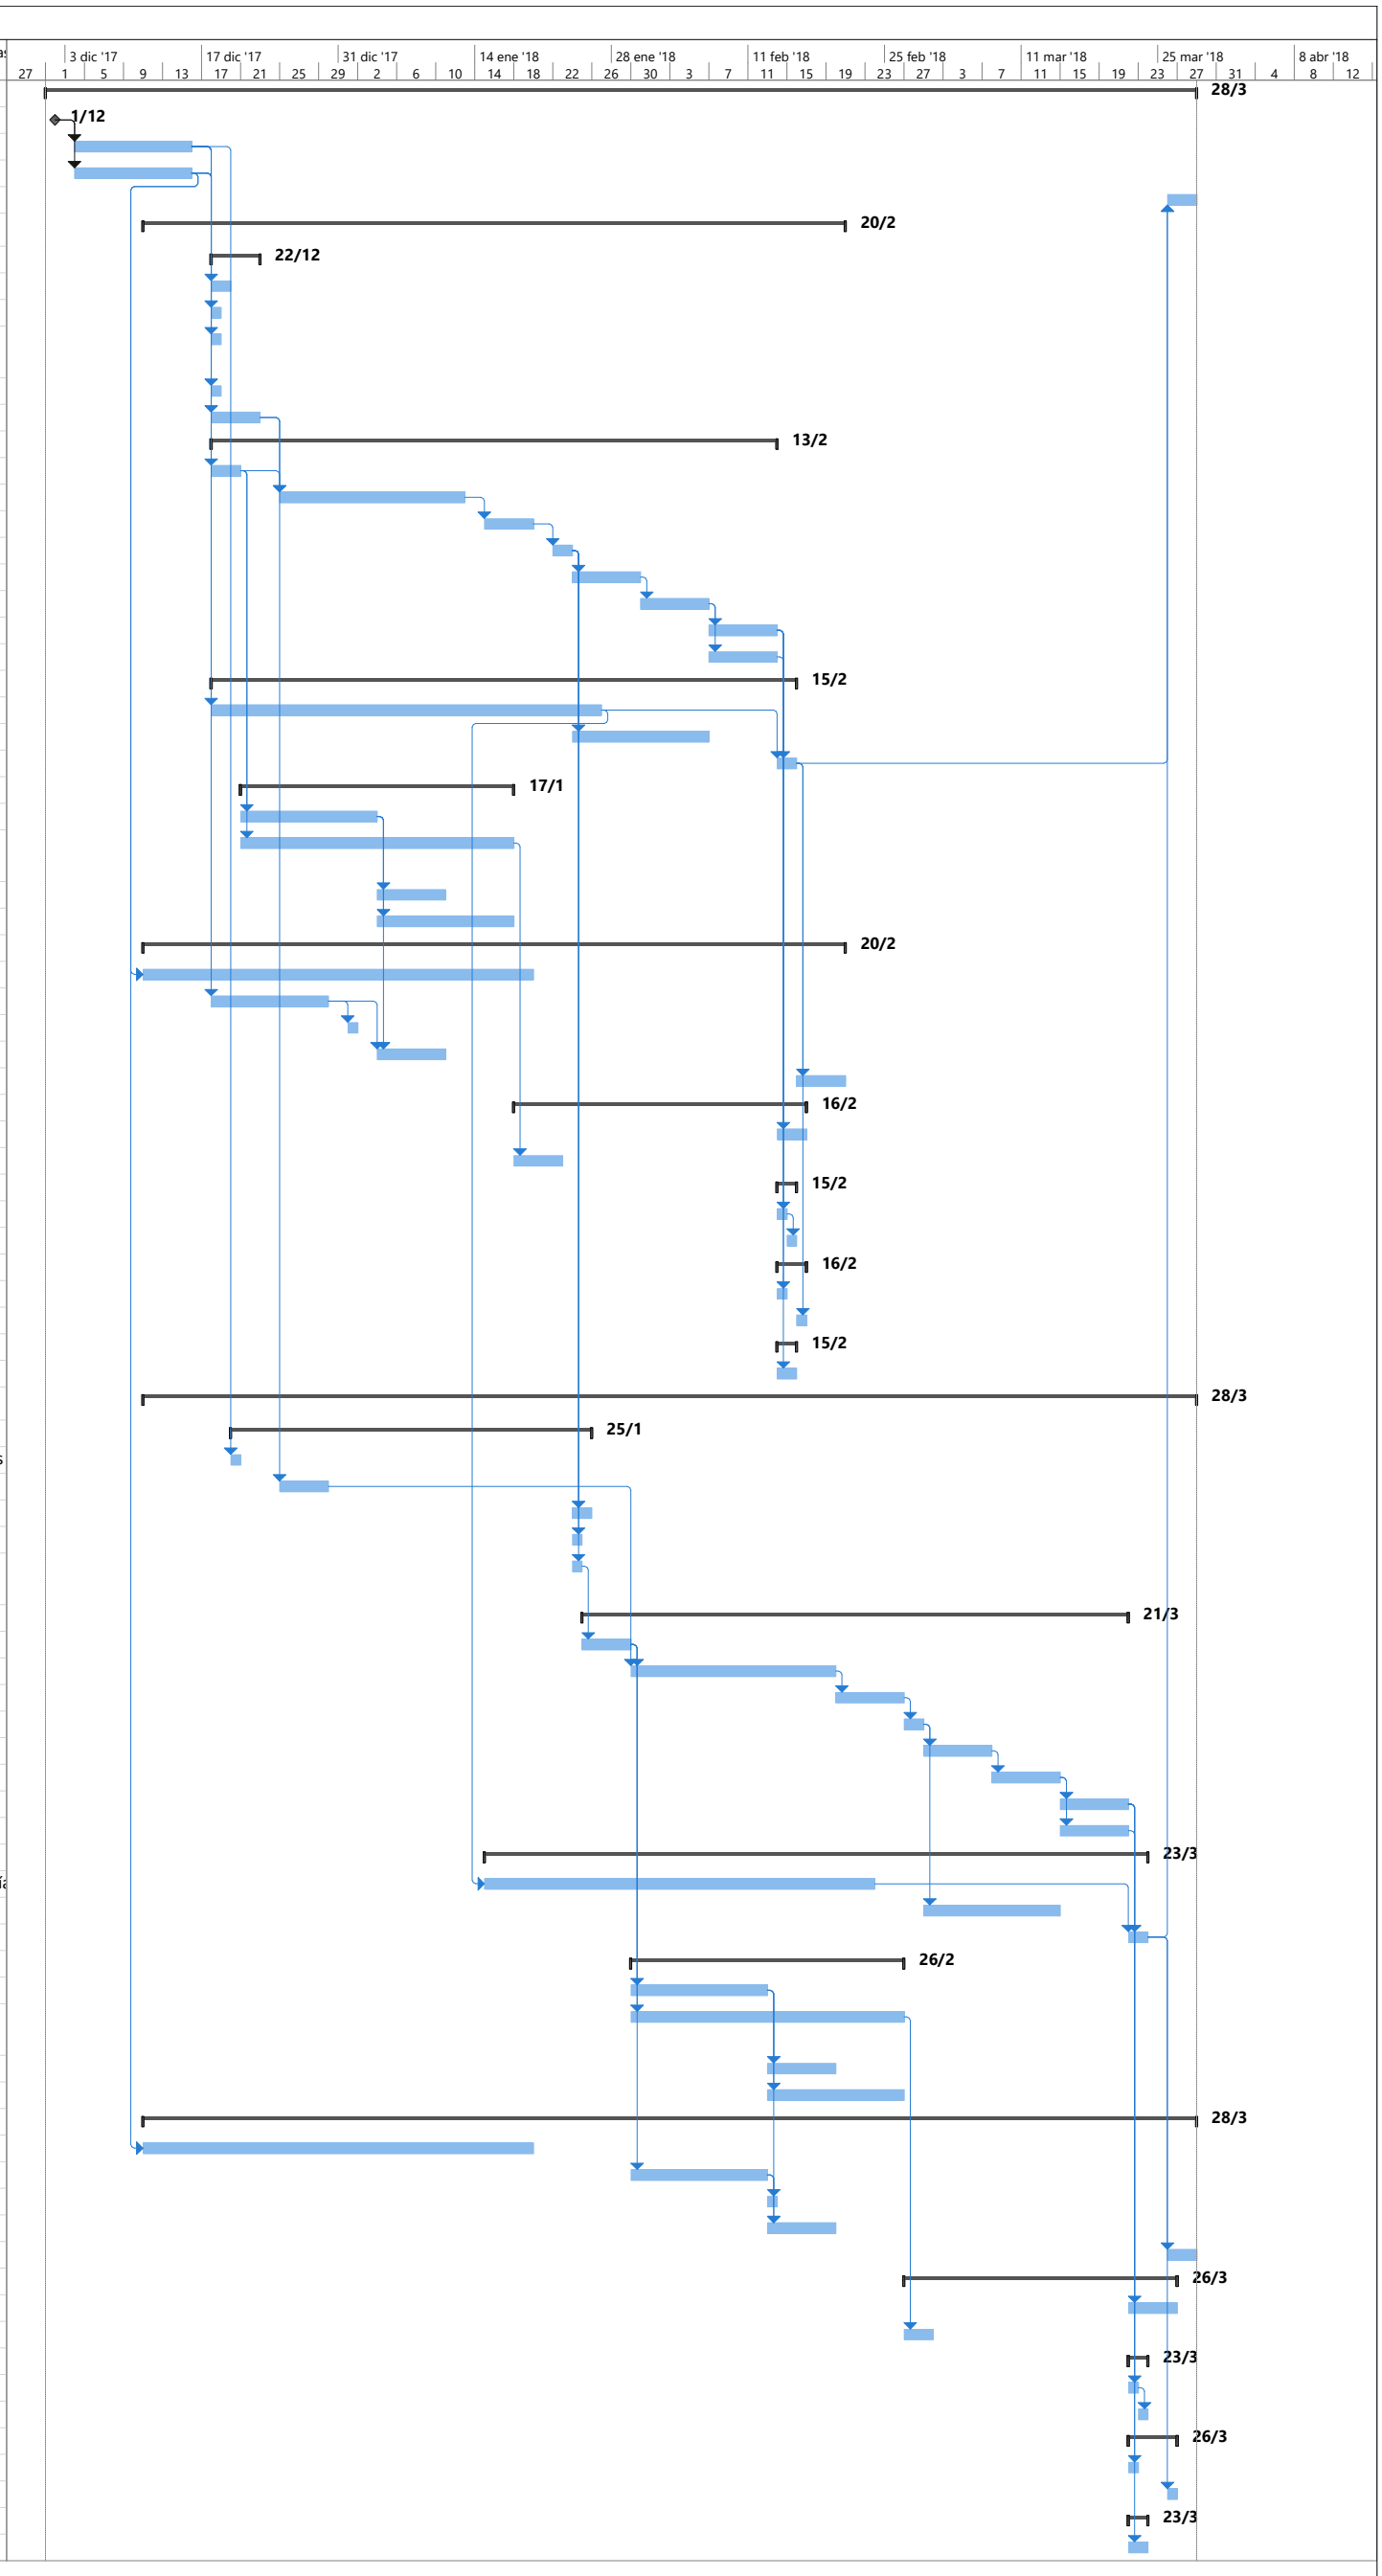

Proyecto: BL-VO-ET050-CR-rev											
	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso		
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual		
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo				
