


TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Construcción de muro cortafuegos en playa de carga de combustibles a furgones de Retiro – Línea San Martín
CODIGO/PLAN: ET MD 04/17

PLAN DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$	UNI	MES 1	MES 2	INCIDENCIA
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			
2	FUNDACIÓN Y COLUMNAS	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			
3	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			
4	PINTURA	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			
5	APEADERO	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			
6	INGENIERÍA CONFORME A OBRA	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			
7	LIMPIEZA DE OBRA	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			

		MES 1	MES 2
CURVA EN % PARCIAL	%		
CURVA EN % ACUMULADO	%		
CURVA EN \$ PARCIAL	\$		
CURVA EN \$ ACUMULADO	\$		

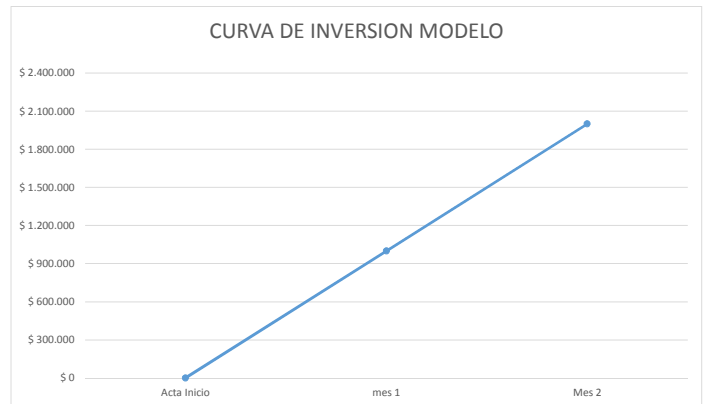

Nota: Los valores representados en las graficas son ilustrativos a efectos del modelo. Las cifras reales surgirán de la Oferta de LA CONTRATISTA
