


TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

RENOVACIÓN DE PINTURA EN BORDES DE ANDÉN - ETAPA 1 - LÍNEA SAN MARTÍN /
LSM-OC-055

PLAN DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$	UNI	MES 1	MES 2	INCIDENCIA
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			
2	RENOVACIÓN DE PINTURA	m2				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			
3	LIMPIEZA DE OBRA	GL				TIEMPO			
						%			
						\$			
						% PARC			

		MES 1	MES 2
CURVA EN % PARCIAL	%		
CURVA EN % ACUMULADO	%		
CURVA EN \$ PARCIAL	\$		
CURVA EN \$ ACUMULADO	\$		

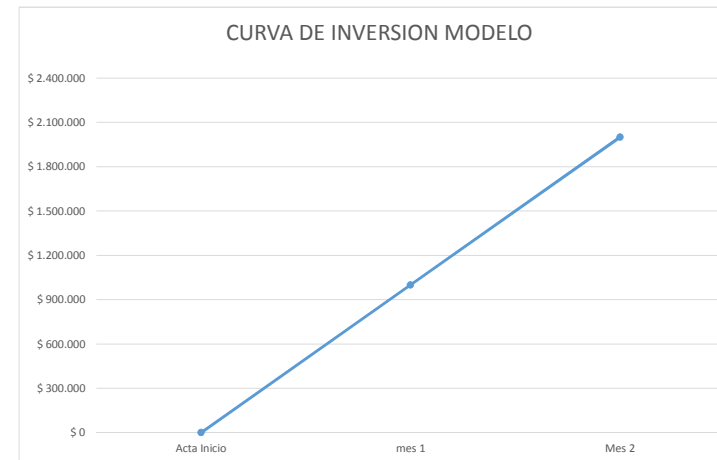

Nota: Los valores representados en las graficas son ilustrativos a efectos del modelo. Las cifras reales surgirán de la Oferta de LA CONTRATISTA
