


ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$	UNI	PLAN DE TRABAJO					INCIDENCIA
							MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
1	TRABAJOS PRELIMINARES					TIEMPO						
						%						
						\$						
2	FUNDACIONES Y ESTRUCTURA H'A*					TIEMPO						
						%						
						\$						
3	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					TIEMPO						
						%						
						\$						
4	CUBIERTA					TIEMPO						
						%						
						\$						
5	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS					TIEMPO						
						%						
						\$						
6	CARPINTERÍAS					TIEMPO						
						%						
						\$						
7	PINTURA					TIEMPO						
						%						
						\$						
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					TIEMPO						
						%						
						\$						
9	INSTALACIÓN SANITARIA					TIEMPO						
						%						
						\$						
10	PROVISIONES GENERALES					TIEMPO						
						%						
						\$						
11	INGENIERÍA CONFORME A OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS					TIEMPO						
						%						
						\$						
12	LIMPIEZA DE OBRA					TIEMPO						
						%						
						\$						

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
CURVA EN % PARCIAL	%					
CURVA EN % ACUMULADO	%					
CURVA EN \$ PARCIAL	\$					
CURVA EN \$ ACUMULADO	\$					

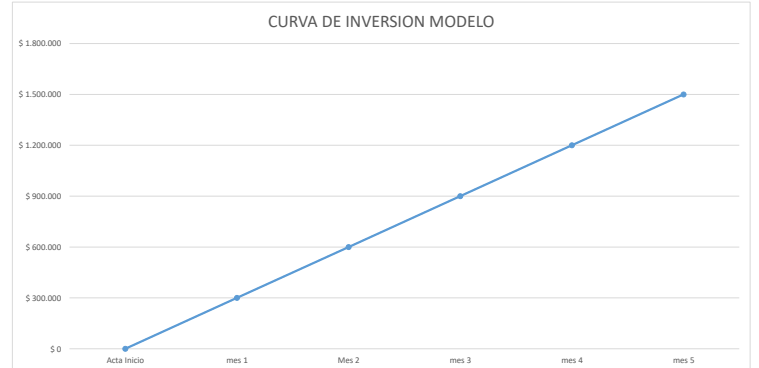

Nota: Los valores representados en las graficas son ilustrativos a efectos del modelo. Las cifras reales surgirán de la Oferta de LA CONTRATISTA
